



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

CÂMARA MUNICIPAL ALTO PARAÍSO
LIDO EM PLENÁRIO
Em 19/02/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FEITOS 2017 NO ANO
DE 2018.

1. - CONVÊNIO – CONTRATADO;

ITEM	LOCAL	TRECHO	EXTENSÃO	UNIDADE
01	Linha C-85	TB-20 (RO 458) / Rio Candeias	34.500,00	Metros
02	Travessão B-10	Linha C-85 / Linha C-90	5.510,00	Metros
03	Travessão B-10	Linha C-90 / Linha C-95	6.320,00	Metros
04	Travessão B-0	Linha C-95 / Linha C-100	5.000,00	Metros
05	Linha C-100	TB-20 (RO 458) / TB-0	17.700,00	Metros
06	Travessão B-0	Linha C-100 / Linha C-105	5.050,00	Metros
07	Linha C-105	TB-10 / Rio Candeias	15.900,00	Metros
TOTAL			89.980,00	Metros

1.1 – LINHA C-85

1.1.1 - CONSERVAÇÃO / RESTAURAÇÃO - Limpeza lateral da vegetação com utilização de motoniveladora;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 34.500,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada – 2,00 lados
- **Limpeza Total – 69.000,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 34.500,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada -2,00 lados
- **Limpeza total – 69,000,00 m²**

1.1.2 –TERRAPLANAGEM – Conformação de plataforma sem adicionamento de material;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 34.500,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 207.000,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 34.500,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros

CÂMARA MUNICIPAL ALTO PARAÍSO
PROTOCOLADO
Em 19/02/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

- Conformação Total – 207.000,00 m²

1.1.3 – REVESTIMENTO PRIMARIO – escavação, carga, descarga, espalhamento de material para revestimento primário, esp. 10 cm;

- Convênio Contratado;

- Comprimento do trecho – 12.400,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 6.200,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 11.408,00 T**

- Execução dos serviços em 2018;


- Não foram executados serviços relacionados a revestimento primário.

1.1.4 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO;






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

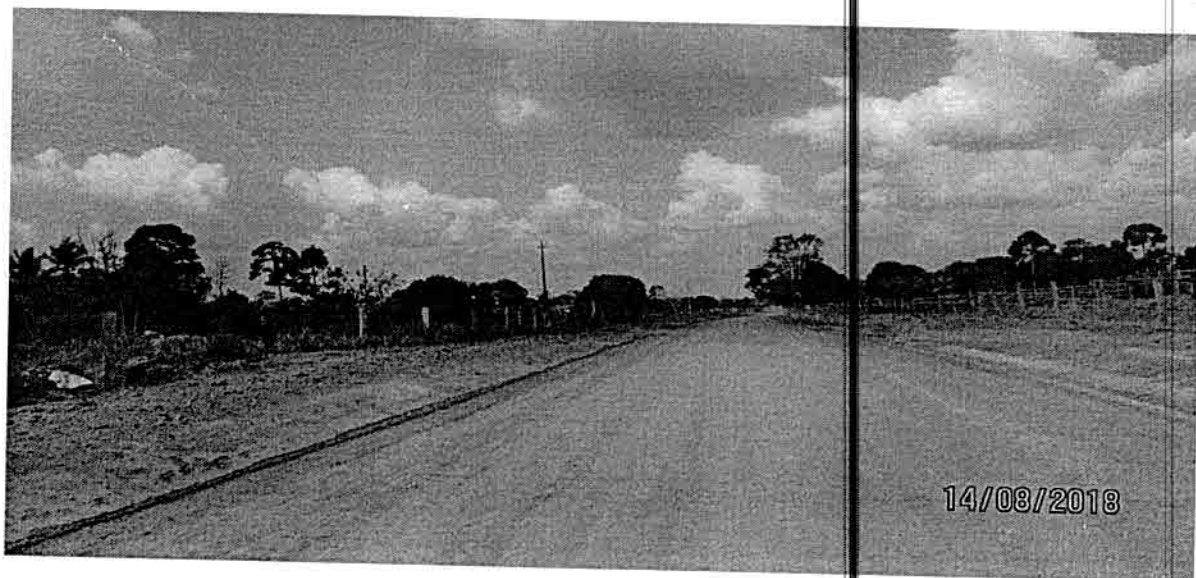



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

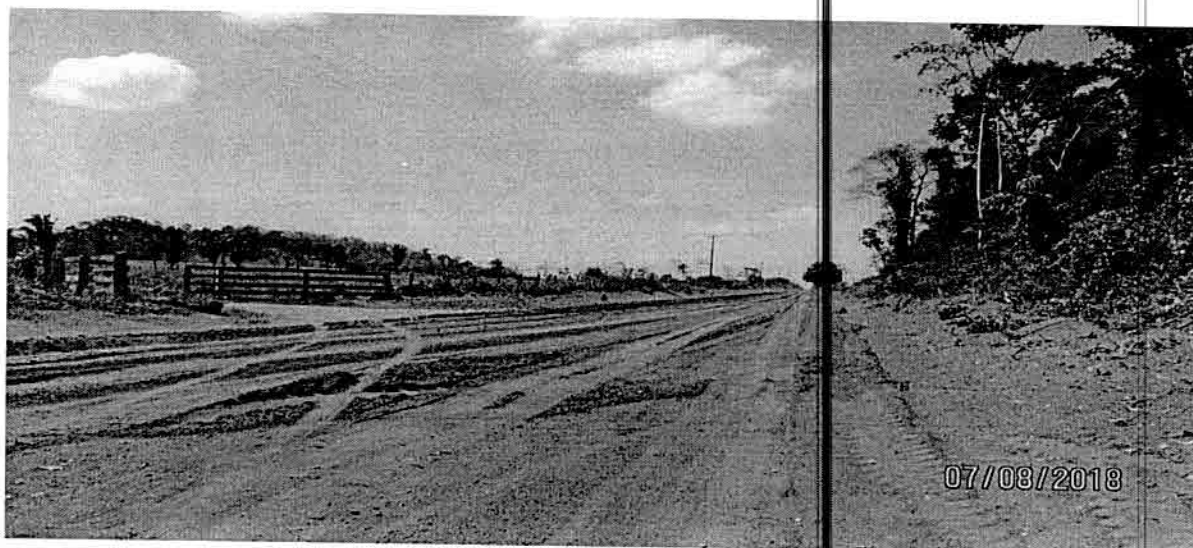

1.2- TRAVESSÃO B-10 (LINHA C-85/LINHA C-90)

1.2.1 - CONSERVAÇÃO / RESTAURAÇÃO - Limpeza lateral da vegetação com utilização de motoniveladora;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 5.510,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada – 2,00 lados
- **Limpeza Total – 11.020,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 5.510,00 metros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada -2,00 lados
- **Limpeza total – 11.020,00 m²**

1.2.2 – TERRAPLANAGEM – Conformação de plataforma sem adicionamento de material;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 1.500,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 33.060,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 1.500,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 33.060,00 m²**

1.2.3 – REVESTIMENTO PRIMARIO – escavação, carga, descarga, espalhamento de material para revestimento primário, esp. 10 cm;

- Convênio Contratado;

- Comprimento do trecho – 1.500,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 750,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 1.380,00 T**



- Execução dos serviços em 2018;

- Não foram executados serviços relacionados a revestimento primário.

1.2.4 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

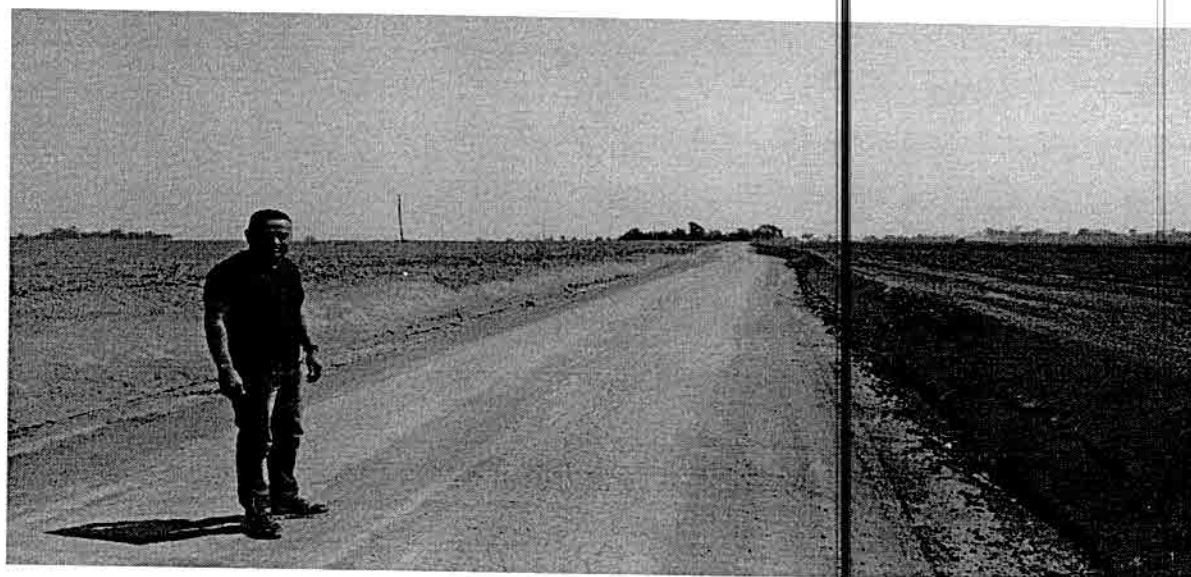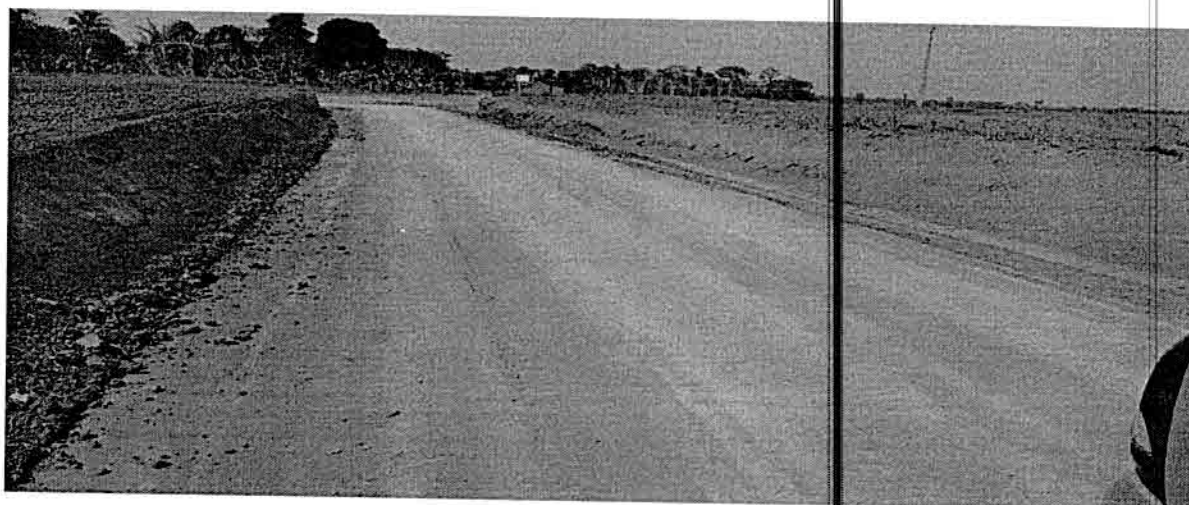



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo



1.3 – TRAVESSÃO B-10 (LINHA C-90/LINHA C-95)

1.3.1 - CONSERVAÇÃO / RESTAURAÇÃO - Limpeza lateral da vegetação com utilização de motoniveladora;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 6.320,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada – 2,00 lados
- **Limpeza Total – 12.640,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 6.320,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada -2,00 lados
- **Limpeza total – 12.640,00 m²**

1.3.2 –TERRAPLANAGEM – Conformação de plataforma sem adicionamento de material;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 6.320,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 37.920,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 6.320,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 37.920,00 m²**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

1.3.3 – REVESTIMENTO PRIMARIO – escavação, carga, descarga, espalhamento de material para revestimento primário, esp. 10 cm;


- Convênio Contratado;

- Comprimento do trecho – 1.500,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 750,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 1.380,00 T**

- Execução dos serviços em 2018;


- Não foram executados serviços relacionados a revestimento primário.

1.3.4 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO;

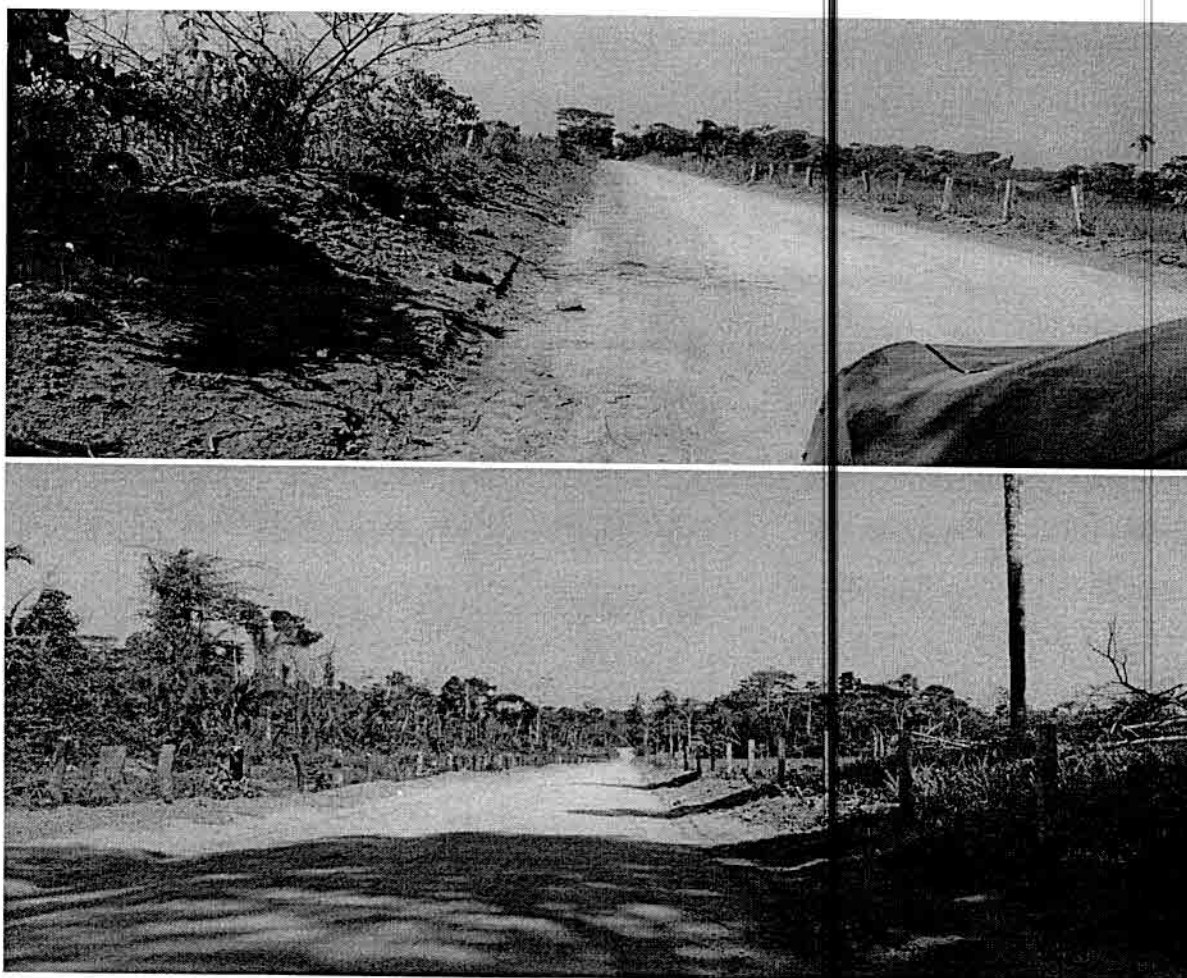



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

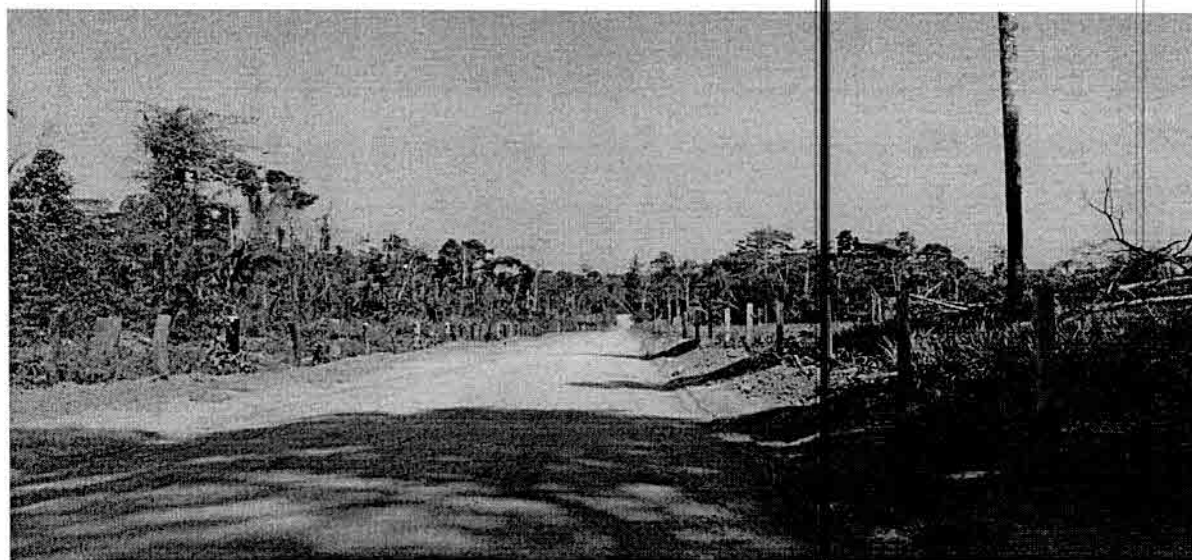

1.4 – TRAVESSÃO B-0 (LINHA C-95/LINHA C-100)

1.4.1 - CONSERVAÇÃO / RESTAURAÇÃO - Limpeza lateral da vegetação com utilização de motoniveladora;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 5.000,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada – 2,00 lados
- **Limpeza Total – 10.000,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 5.000,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

- Laterais da estrada - 2,00 lados
- **Limpeza total – 10.000,00 m²**

1.4.2 – TERRAPLANAGEM – Conformação de plataforma sem adicionamento de material;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 5.000,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 30.000,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 5.000,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 30.000,00 m²**

1.4.3 – REVESTIMENTO PRIMARIO – escavação, carga, descarga, espalhamento de material para revestimento primário, esp. 10 cm;

- Convênio Contratado;

- Comprimento do trecho – 1.500,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 750,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 1.380,00 T**

- Execução dos serviços em 2018;

- Não foram executados serviços relacionados a revestimento primário.

1.4.4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

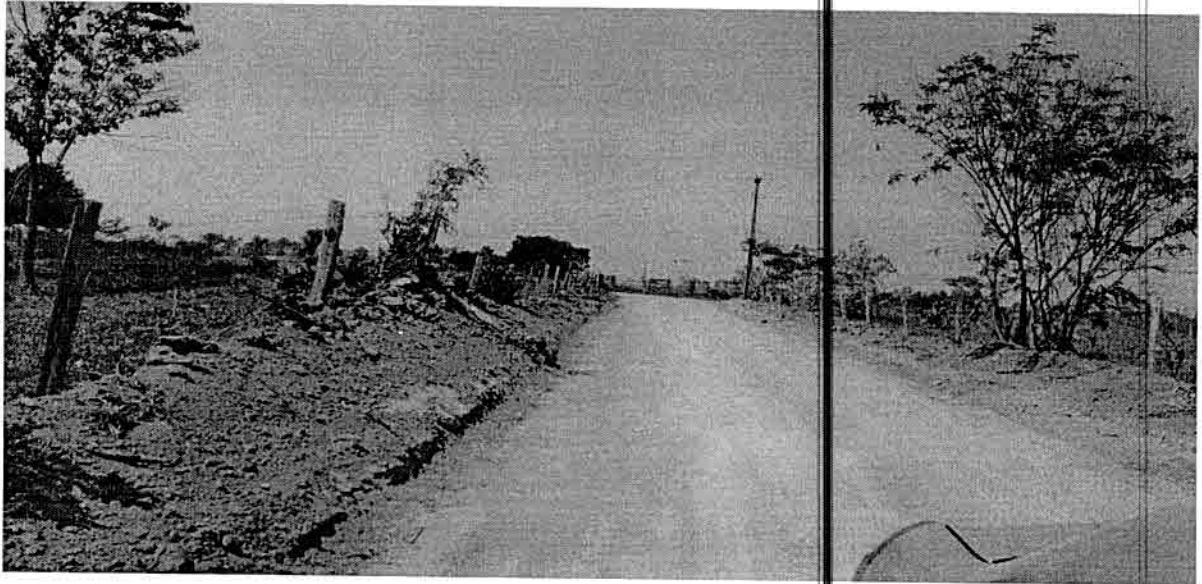

1.5 – LINHA C-100 (TB-20 /TB-0);

1.5.1 - CONSERVAÇÃO / RESTAURAÇÃO - Limpeza lateral da vegetação com utilização de motoniveladora;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 17.700,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada – 2,00 lados
- **Limpeza Total – 35.400,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 17.700,00 metros
- Largura da limpeza – 1,00 metros
- Laterais da estrada -2,00 lados
- **Limpeza total – 35.400,00 m²**

1.5.2 –TERRAPLANAGEM – Conformação de plataforma sem adicionamento de material;

- Convênio Contratado;

- Comprimento da estrada – 17.700,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 106.200,00 m²**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento da estrada – 17.700,00 metros
- Largura da plataforma - 6,00 metros
- **Conformação Total – 106.200,00 m²**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

1.5.3 – REVESTIMENTO PRIMARIO – escavação, carga, descarga, espalhamento de material para revestimento primário, esp. 10 cm;

- Convênio Contratado;

- Comprimento do trecho – 5.500,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 2.750,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 5.060,00 T**

- Execução dos serviços em 2018;

- Comprimento do trecho – 5.500,00 metros
- Espessura de revestimento – 0,10 metros
- Largura da plataforma – 5,00 metros
- Massa específica do material – 1,84 t/m³
- **Escavação, carga, descarga Total – 2.750,00 m³**
- **Volume total de revestimento – 5.060,00 T**

1.5.4 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO;





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDONIA
Poder Executivo

